




HAVELLANDAUTOBAHN

Das Verfügbarkeitsmodell A10/A24 –
zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin

A10-Konferenz 2020 – Landkreis Oberhavel


30. September 2020



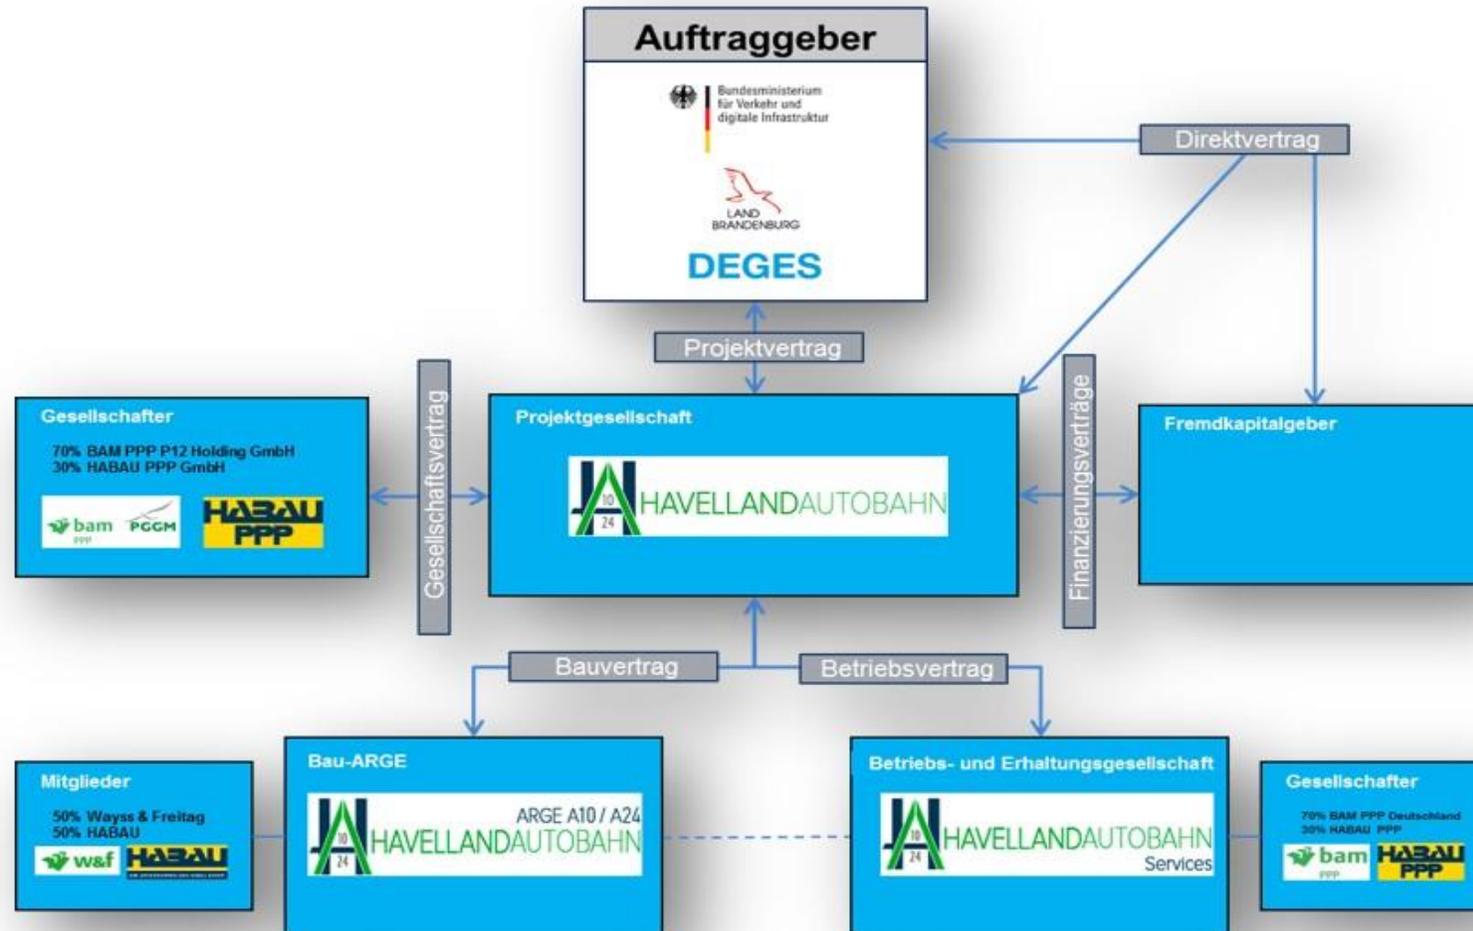



Projektgegenstand

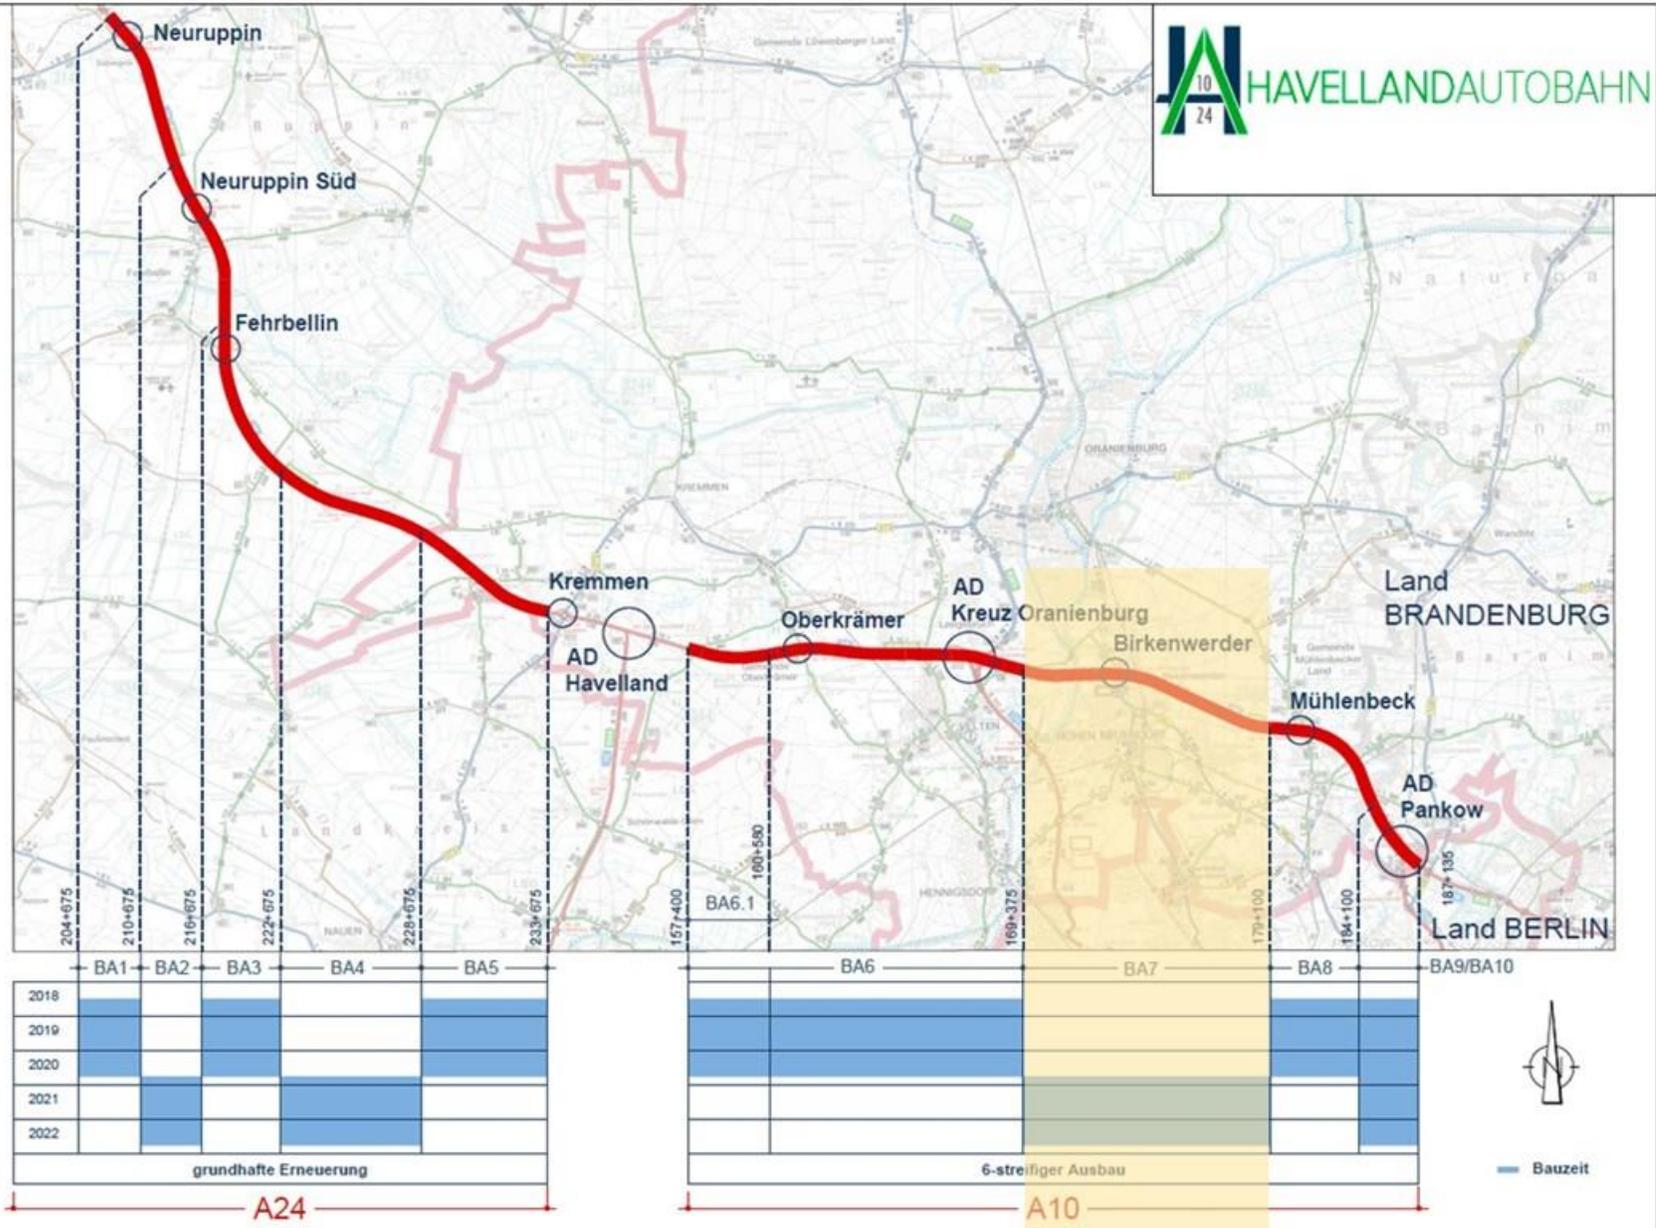

Beginn Vergabeverfahren	05/2015
Beginn Vertragszeitraum	03/2018
Betriebsbeginn	09/2018
Bauende	12/2022
Ende Vertragszeitraum	02/2048
Länge Projektstrecke	65 km
Streckenreuebau	60 km
Neubau Brücken	39 Stück
Temp. Seitenstreifenfreigabe (A24)	16 km
Baukosten	ca. 650 Mio. €
Projektvolumen	ca. 1,4 Mrd. €

10

24

Projektstand 09/2020



Streckenbau [km]

63 von 120



Brückenbauwerke [Stck]

24 von 38



Anschlussstellen [Stck]

8 von 14



Bauzeit [Mo]

31 von 58



Park- und WC Anlagen [Stck]

2 von 10



Lärmschutzwände [km]

12 von 20



Erdbau Auf- und Abtrag [Mio m³]

3,9 von 5 Mio. m³



Bauleistung


65,3 %



Bauabschnitt	Avisierte Gesamtfertigstellung
Bauabschnitt BA6.1 PWC Ziethener Luch, PWC Krämerforst	08/2020 - fertiggestellt
Bauabschnitt BA6.2 AS Oberkrämer, AD Kreuz Oranienburg	11/2020
Bauabschnitt BA08 AS Mühlenbeck, 2x Parkplatz	11/2020
Bauabschnitt BA07L (HH) AS Birkenwerder (Nord); 1x Parkplatz	12/2021
Bauabschnitt BA07R (B) AS Birkenwerder (Süd); 1x Parkplatz	12/2022
Bauabschnitt BA09 (BA10 – A114) AD Pankow	12/2022



Brückenbau BA7 – Sperren

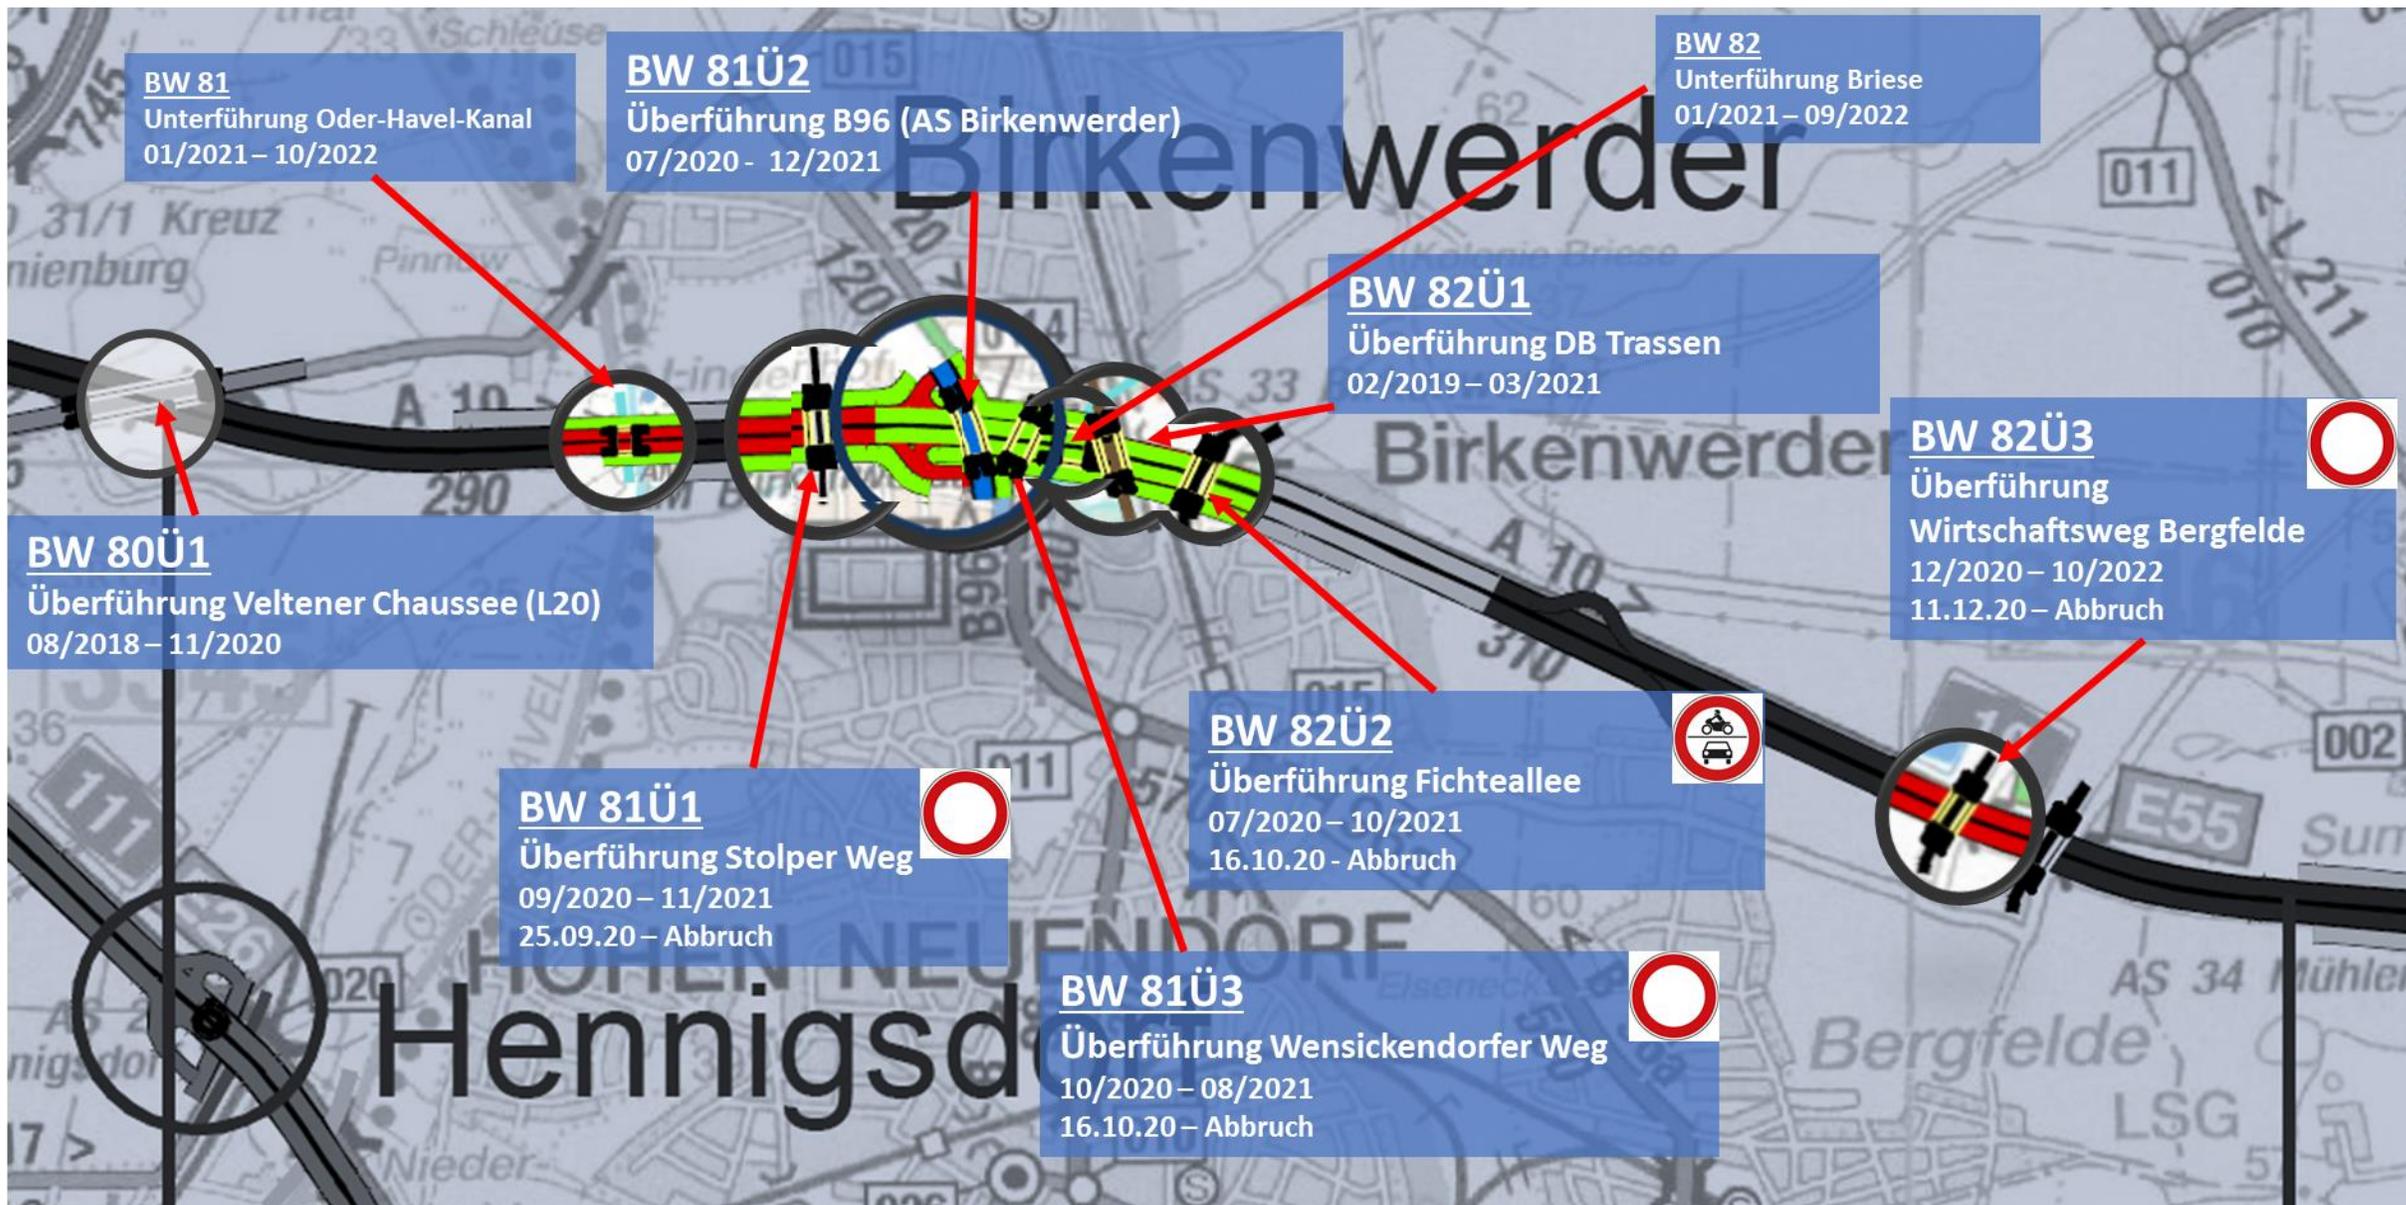



A10 - Vollsperrungen 2020

Datum		Brücke	Maßnahme	Sperrung	
von	bis			von	bis
Fr., 04.09.20	Mo., 07.09.20	BW 81Ü2	Einhub der Behelfsbrücke am AS Birkenwerder	AS Birkenwerder	AD Pankow
Fr., 11.09.20	Mo., 14.09.20	BW 0Ü1	Einhub Überflieger A 10 (Ost) - A114	A10	A114
Fr., 18.09.20	Mo., 21.09.20	BW 82Ü1 BW 82Ü2 BW 86Ü3	Einhub der neuen DB-Fernbahnbrücke Einhub der Behelfsbrücke Fichteallee Einhub Überflieger A114 zur A10(West)	AS Birkenwerder	AD Pankow
Fr., 25.09.20	Mo., 28.09.20	BW 81Ü1	Abbruch Brücke Stopler Weg	AD Kreuz Oranienburg	AS Birkenwerder
Fr., 16.10.20	Mo., 19.10.20	BW 81Ü3 BW 82Ü2	Abbruch Fußgängerbrücke Wensickendorfer Weg Abbruch Bestandsbauwerk Fichteallee	AS Birkenwerder	AS Mühlenbeck
Fr., 23.10.20	Mo., 26.10.20	BW 81Ü2	Abbruch Bestandsbauwerk AS Birkenwerder	AS Birkenwerder	AS Mühlenbeck
Fr., 30.10.20	Mo., 02.11.20	BW 83Ü1	Einhub Träger Zehnrutenwegbrücke	AS Mühlenbeck	AD Pankow
So., 08.11.20	Mi., 11.11.20	BW 82Ü1	Einhub DB-Brücke (S-Bahn)	AD Kreuz Oranienburg	AD Pankow
Fr., 20.11.20	Mo., 23.11.20	BW 80Ü1	Abbruch Brücke Veltener Chaussee	AD Kreuz Oranienburg	AS Birkenwerder
Fr., 11.12.20	Mo., 14.12.20	BW 82Ü3	Abbruch Brücke Wirtschaftsweg Bergfelde	AS Birkenwerder	AS Mühlenbeck



Vollsperrung

S-Bahn

09.11.20 - 16.11.20

Autobahn A10

08.11.20 – 11.11.20




Altes Widerlager

Bauzustand nach Einhub der neuen Überbauten

Sequenz 1 Verkehrssicherung A10

- Vollsperrung der Autobahn ab So 08.11 23:00 Uhr bis Mi 11.11 21:00 Uhr

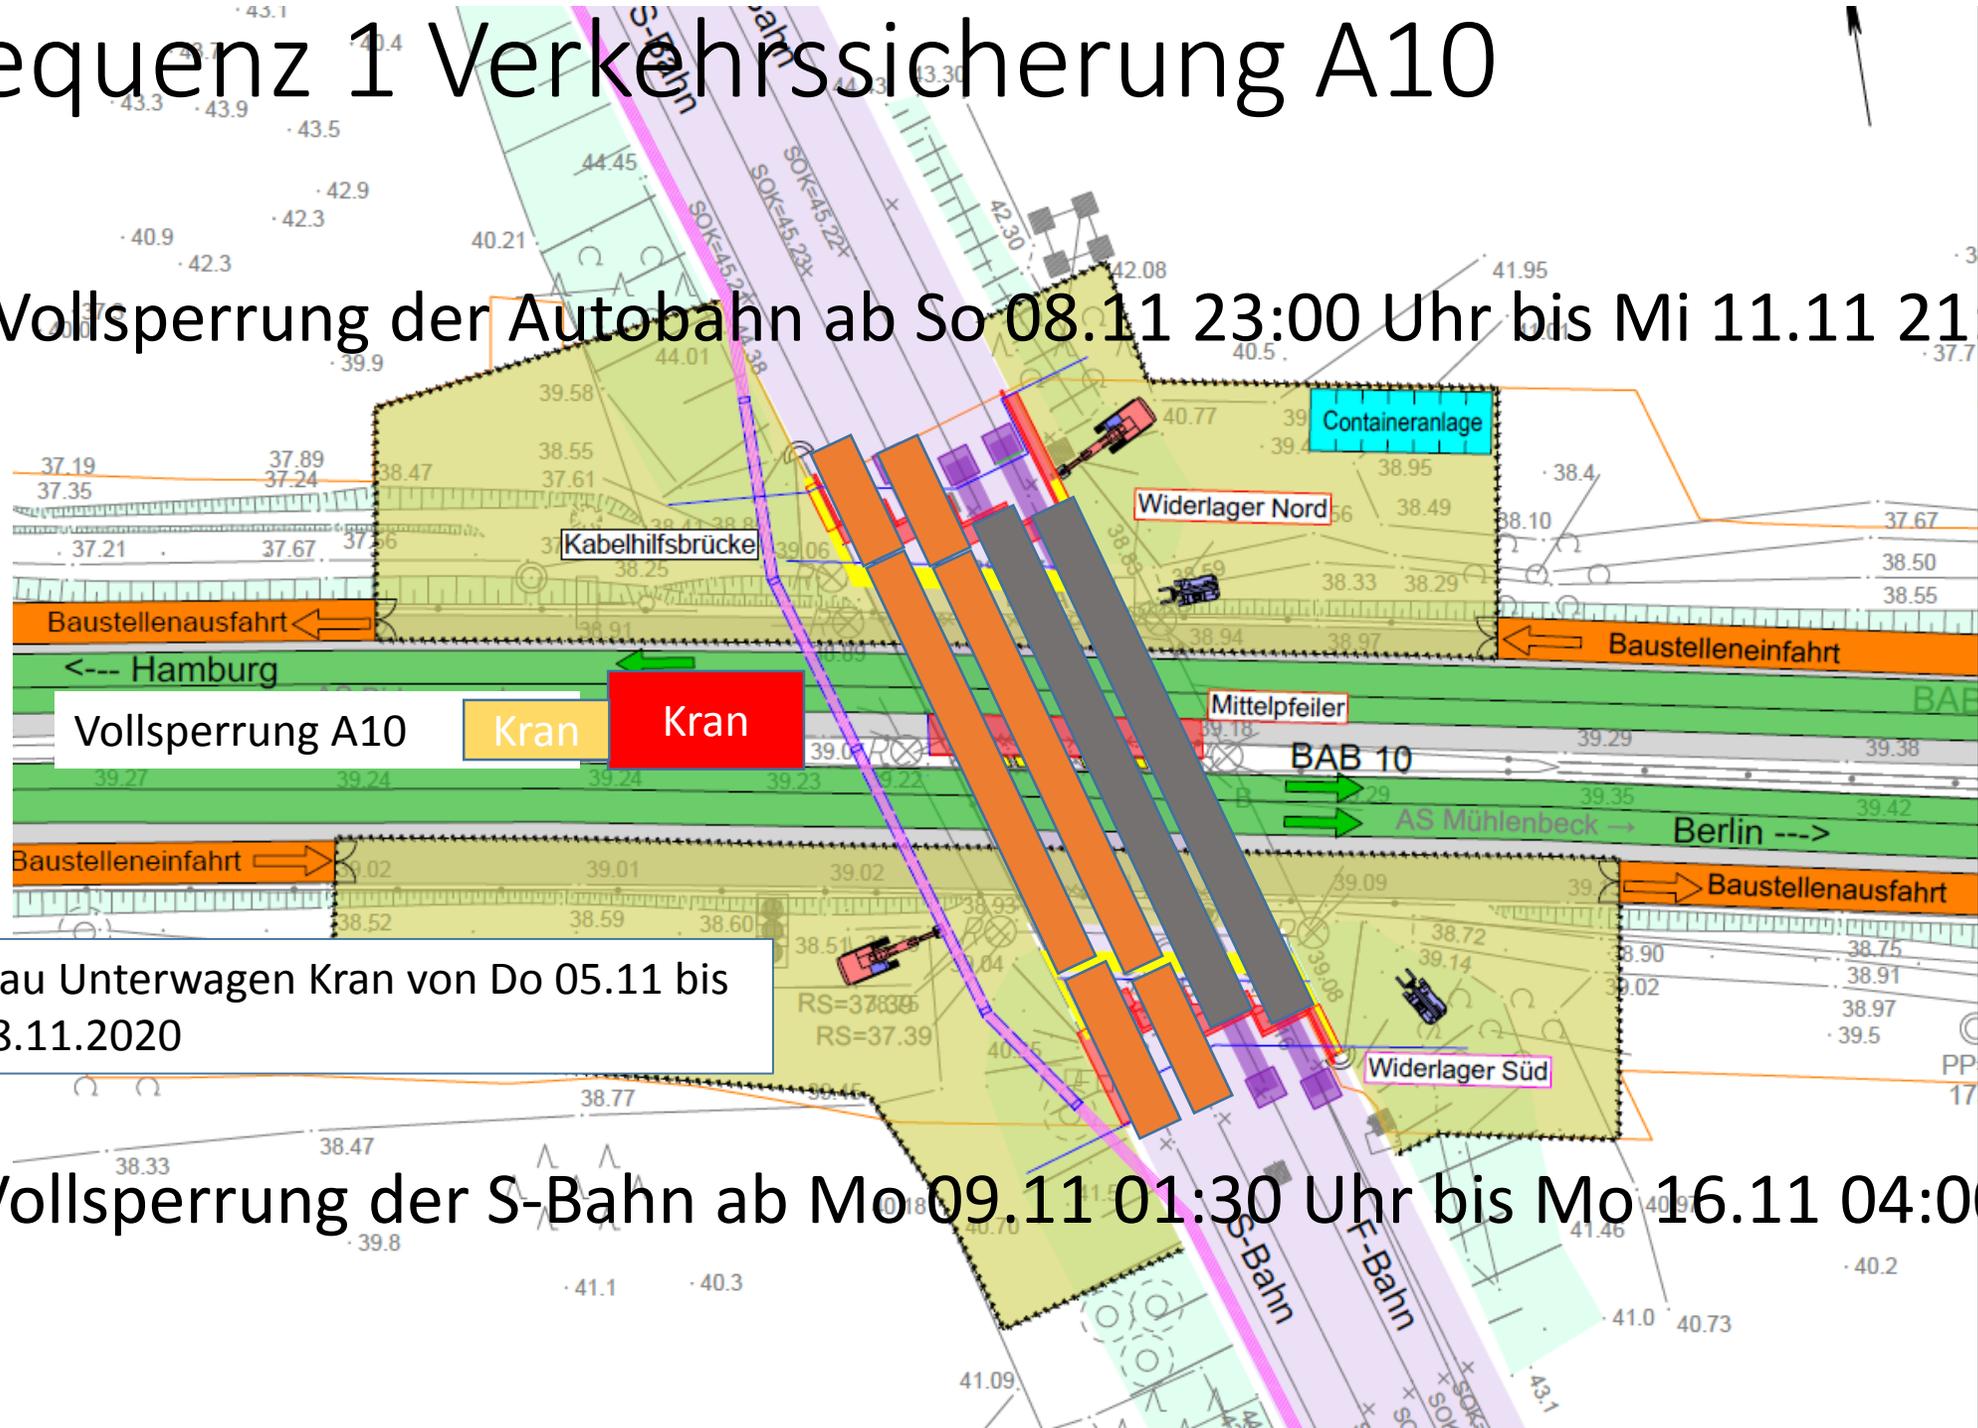

Aufbau Unterwagen Kran von Do 05.11 bis So 08.11.2020

- Vollsperrung der S-Bahn ab Mo 09.11 01:30 Uhr bis Mo 16.11 04:00 Uhr

24

10

10


24

DB Bauwerk – Sperrpause 20



Sequenz 2 – Demontage und Abbrucharbeiten

- Rückbau Stromschiene Gleis 3 und 4 Mo 09.11
- Rückbau Gleis 4 und Schotter Mo 09.11

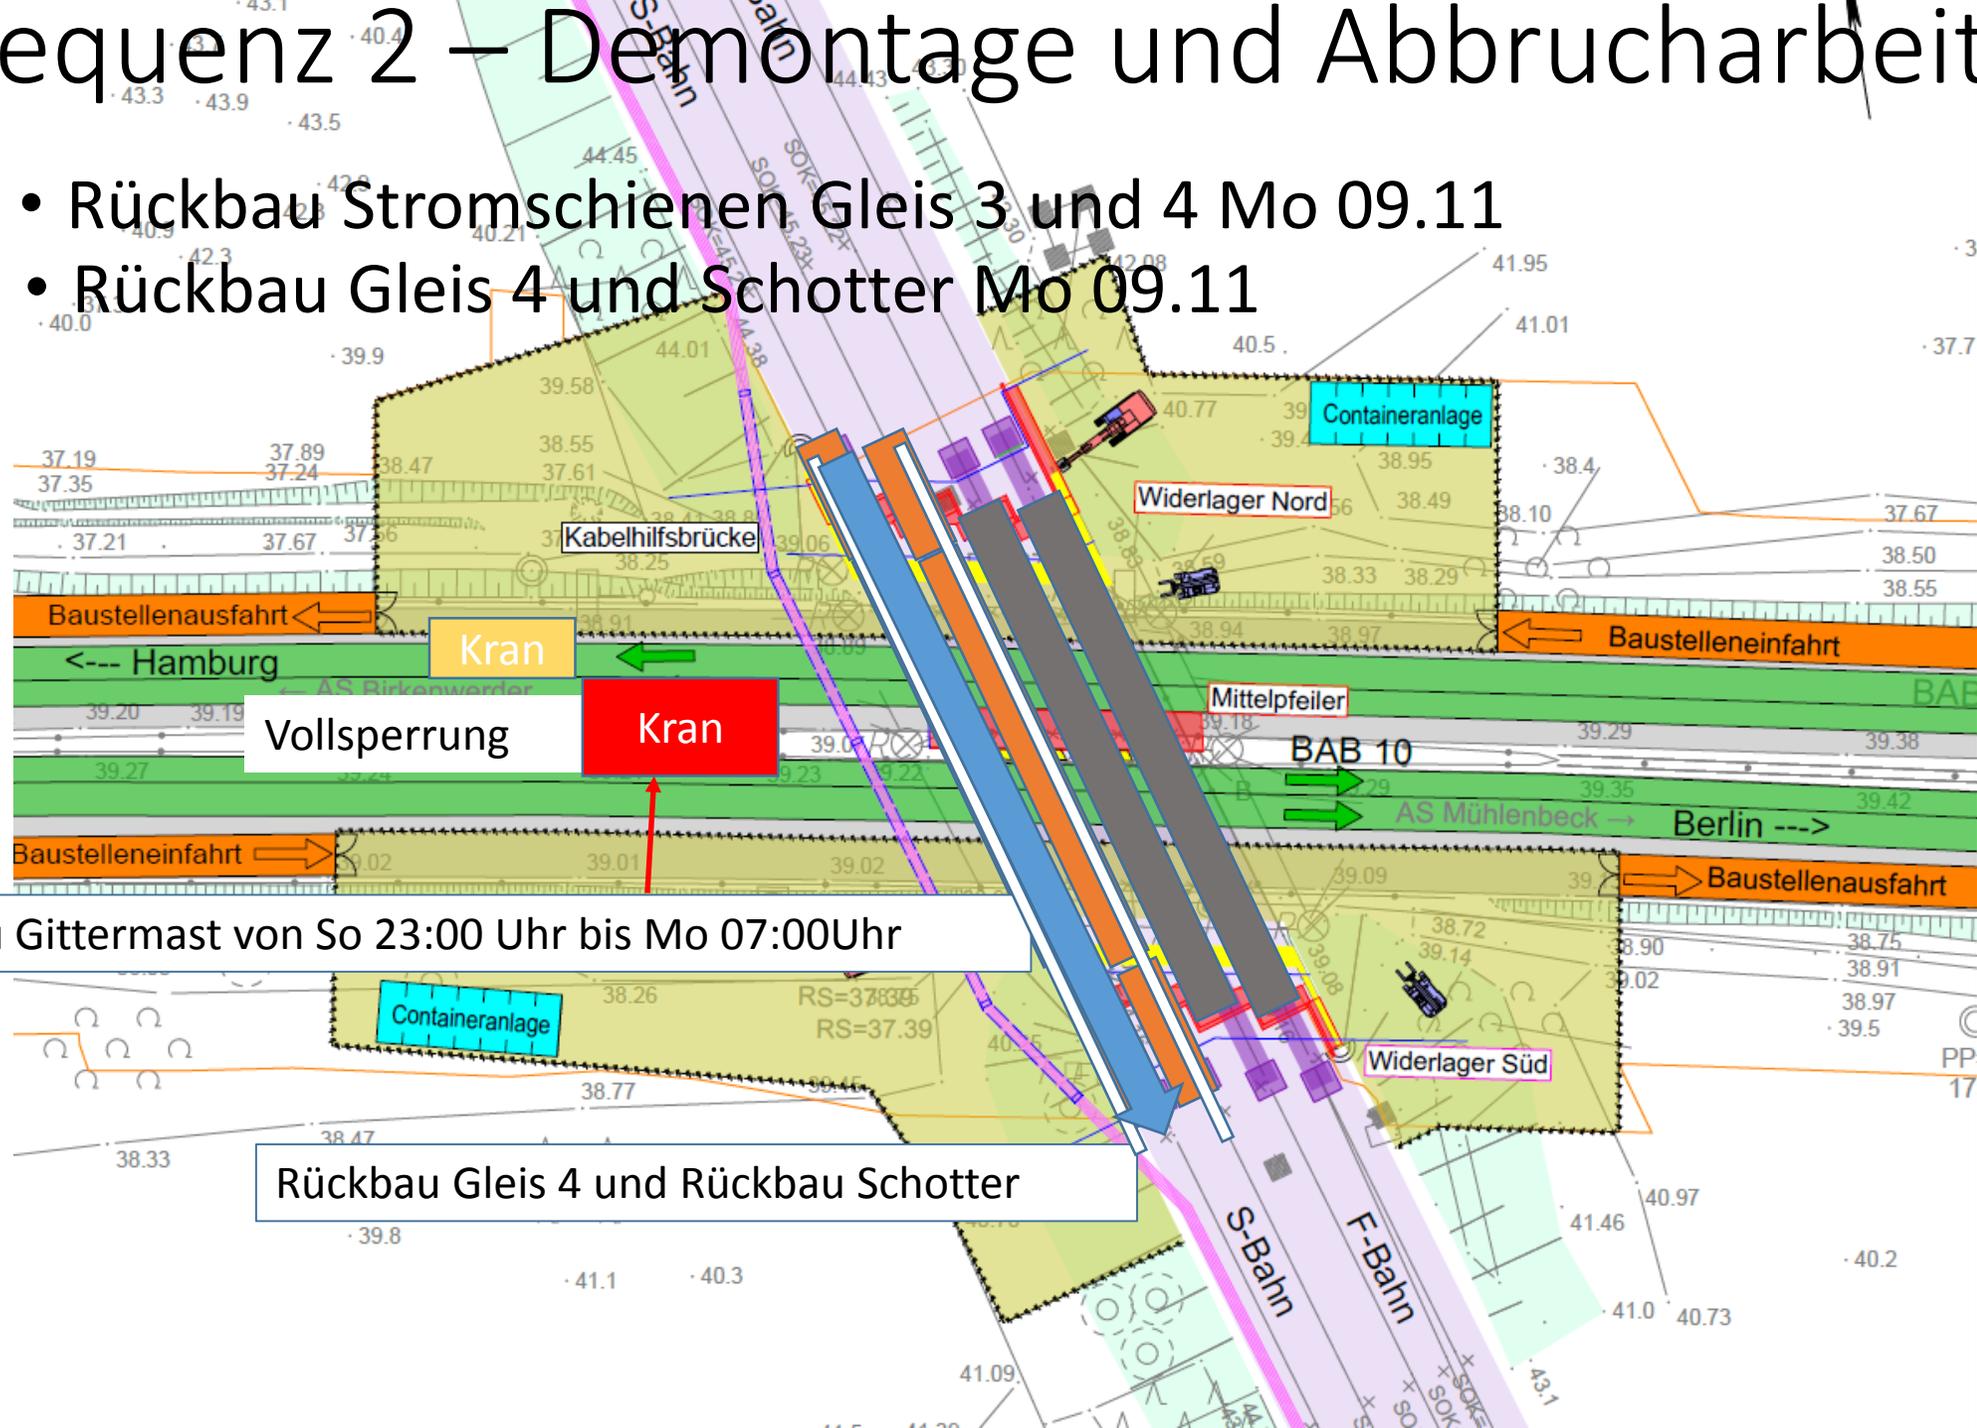


Aufbau Gittermast von So 23:00 Uhr bis Mo 07:00Uhr

Rückbau Gleis 4 und Rückbau Schotter


Sequenz 2 – Demontage und Abbrucharbeiten

- Rückbau Gleis 3 und Schotter am Mo 09.11
- Rückbau Hilfsbrücken Gleis 4 und 3 (Nord) am Die 10.11
- Rückbau alter Überbau Gleis 4 am Die 10.11

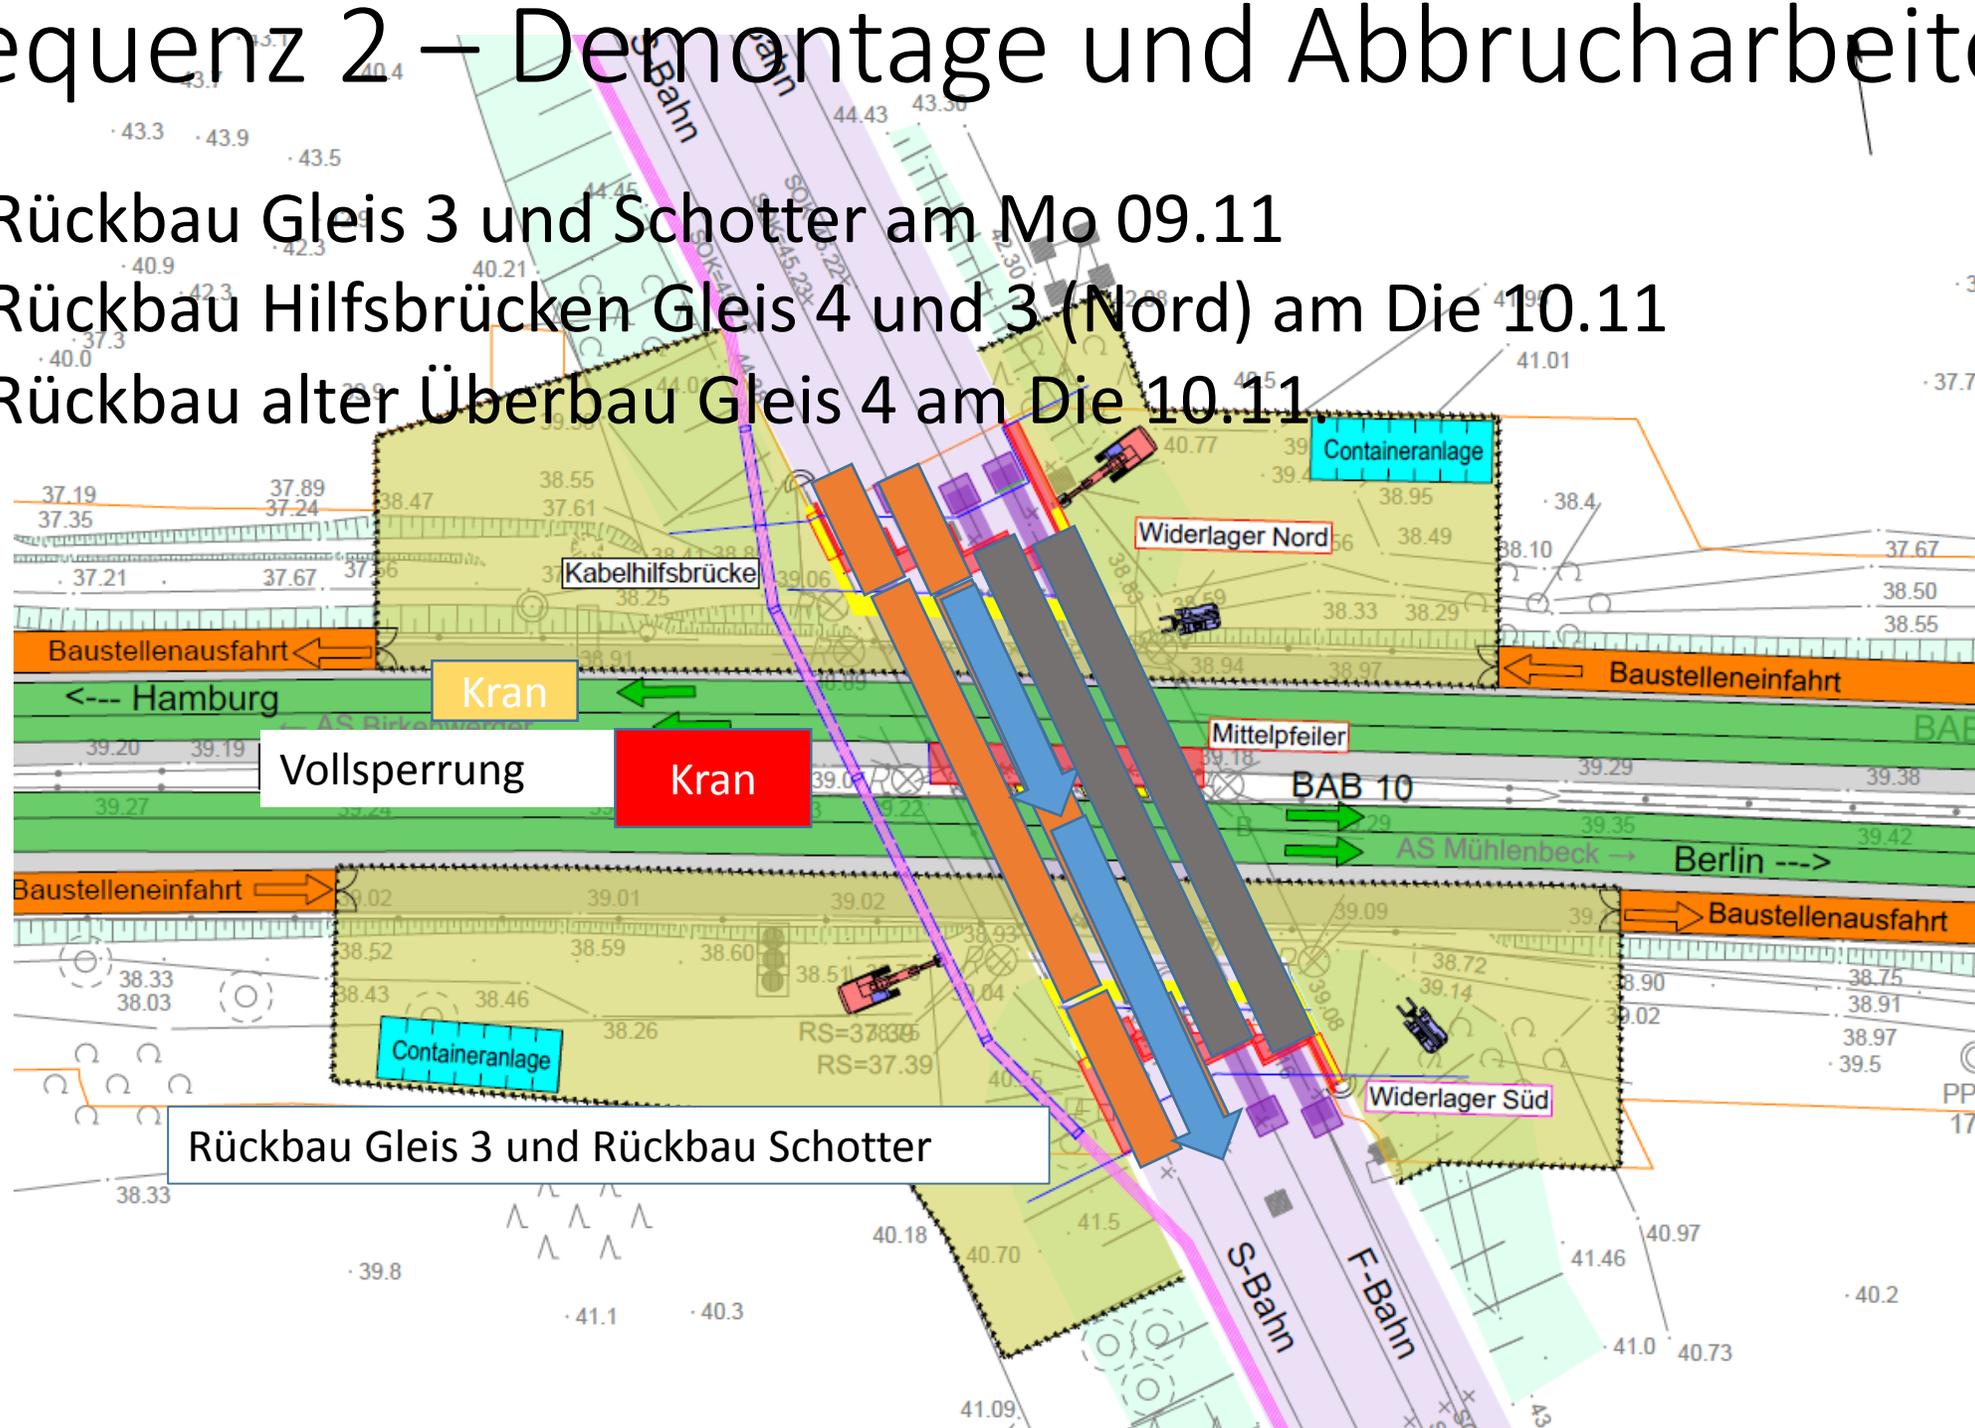

Sequenz 2 – Demontage und Abbrucharbeiten

- Rückbau Gleis 3 und Schotter am Mo 09.11
- Rückbau alter Überbau Gleis 3 am Die 10.11

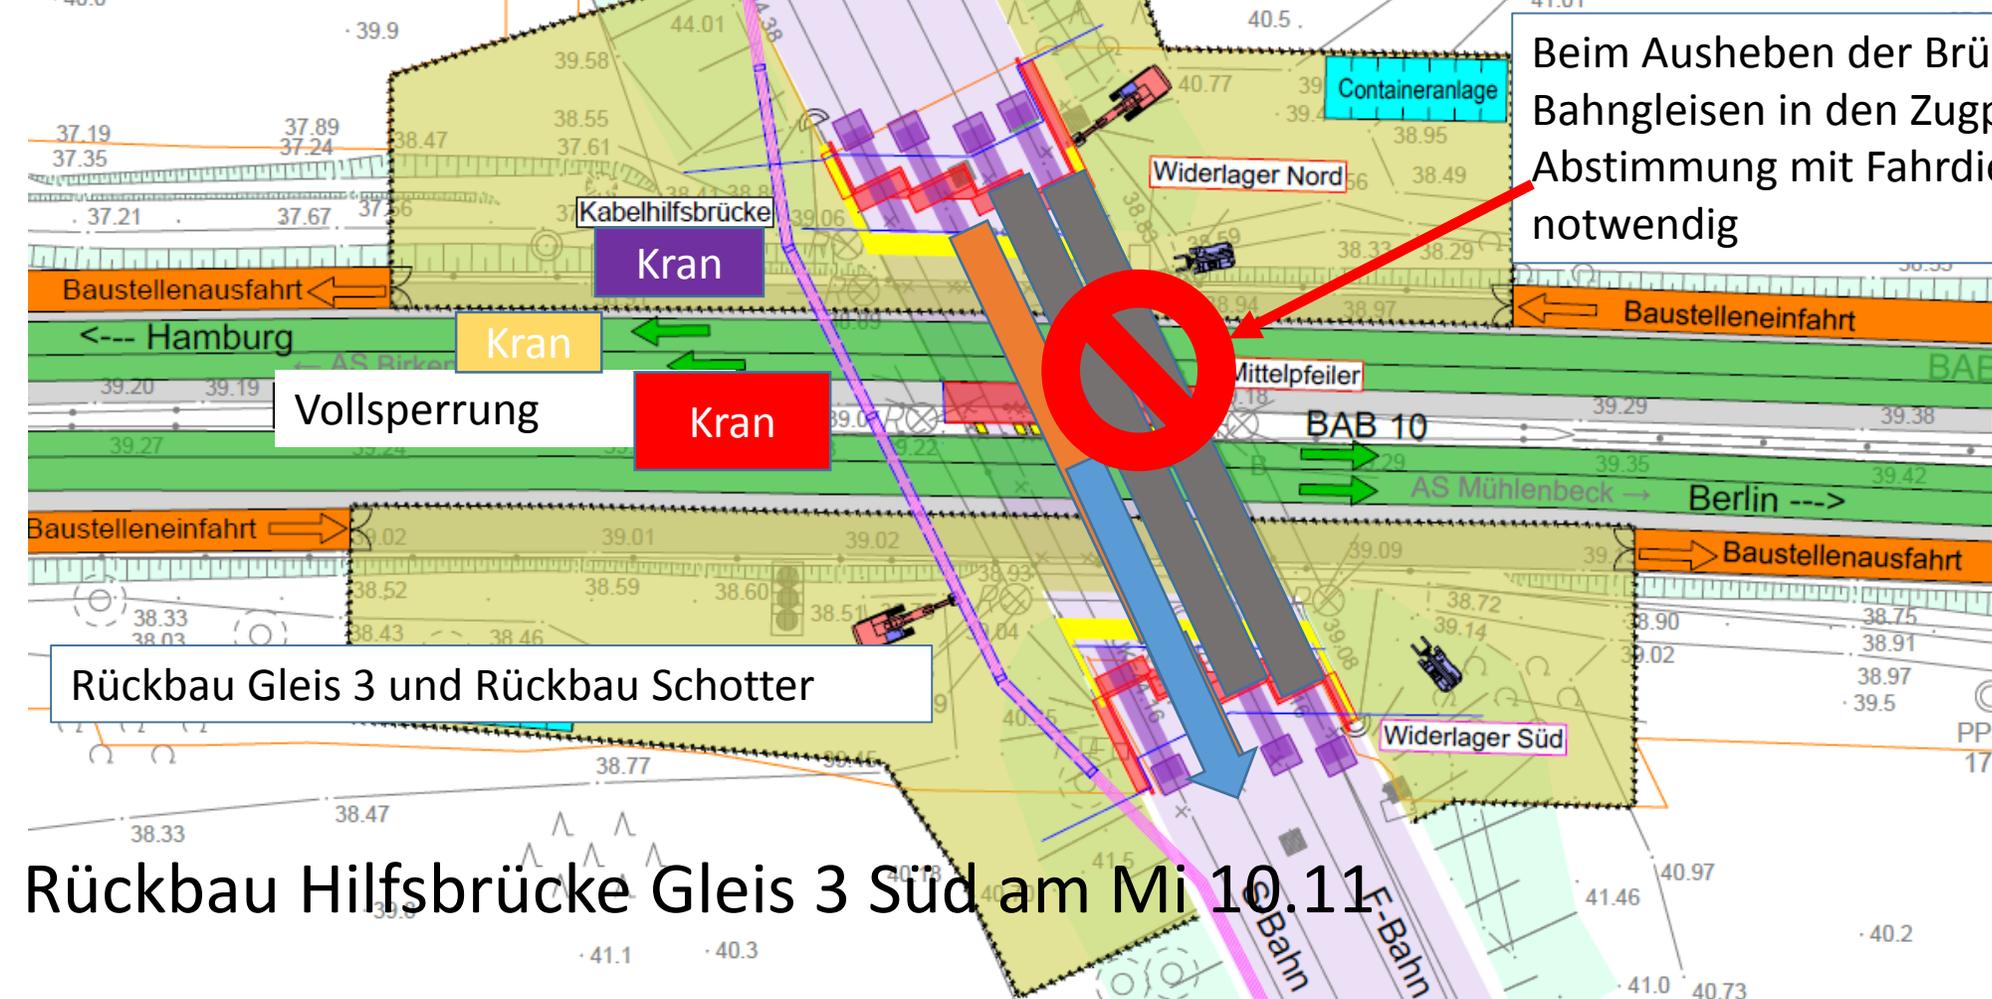


Beim Ausheben der Brücken – Sperrung F-Bahngleisen in den Zugpausen – Abstimmung mit Fahrdienstleiter notwendig

Rückbau Gleis 3 und Rückbau Schotter

- Rückbau Hilfsbrücke Gleis 3 Süd am Mi 10.11

Sequenz 2 – Demontage und Abbrucharbeiten

- Abbruch altes Widerlager am Die 10.11

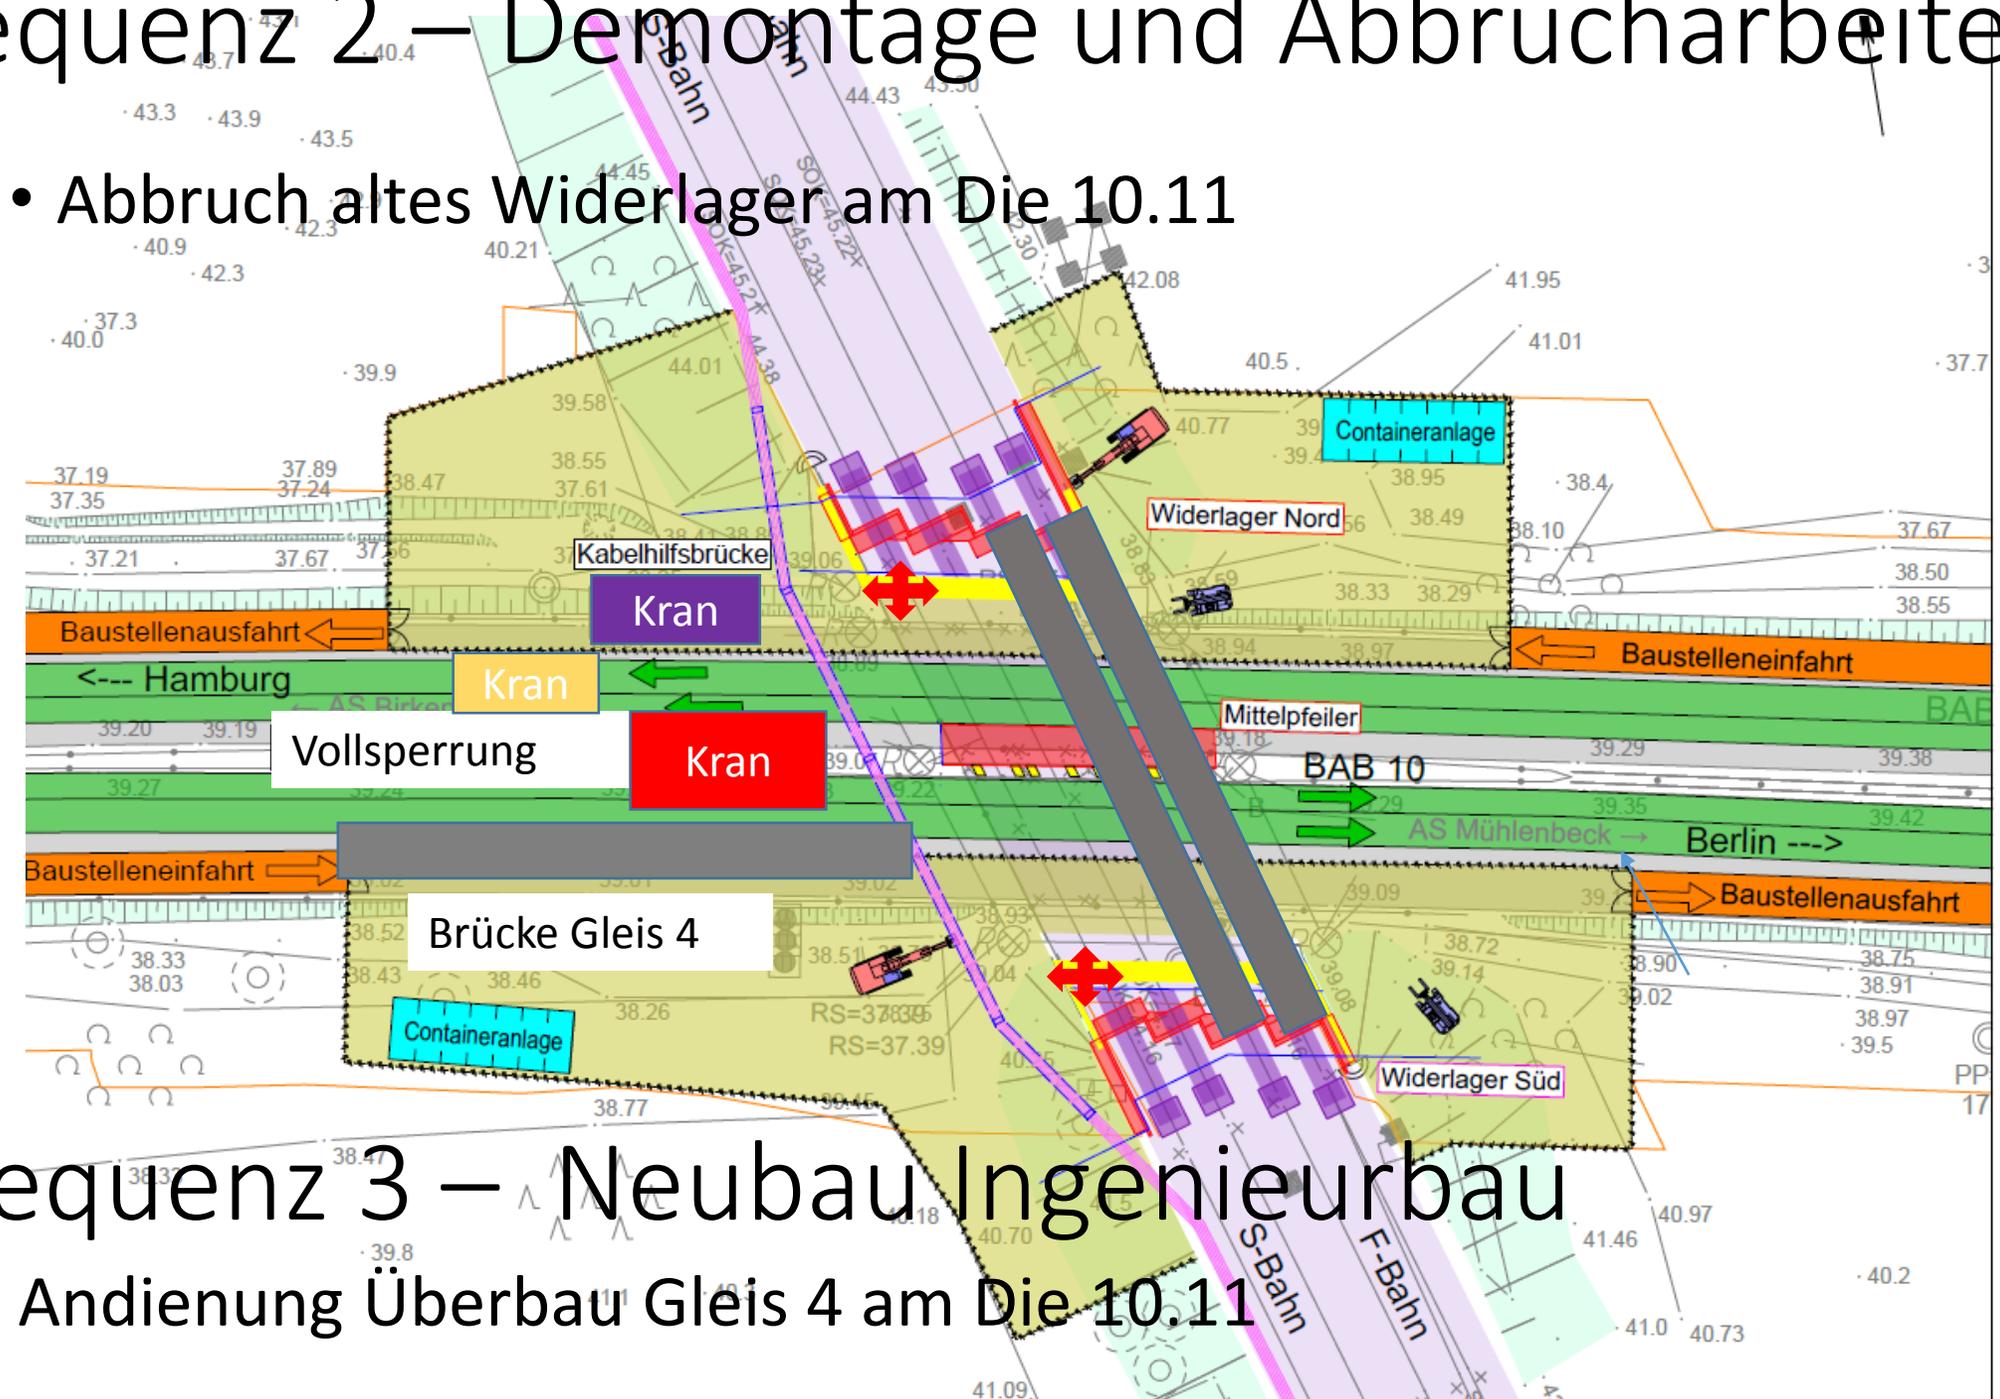


Sequenz 3 – Neubau Ingenieurbau

- Andienung Überbau Gleis 4 am Die 10.11

Sequenz 3 – Neubau Ingenieurbau

- Einbau Überbau Gleis 3 am Mi 11.11.2020
- Betonleitwände + Schutzplanken Nord


Beim Einbau der Brückenüberbauten-Sperrung S-Bahngleisen in den Zugpausen – Abstimmung mit Fahrdienstleiter notwendig.

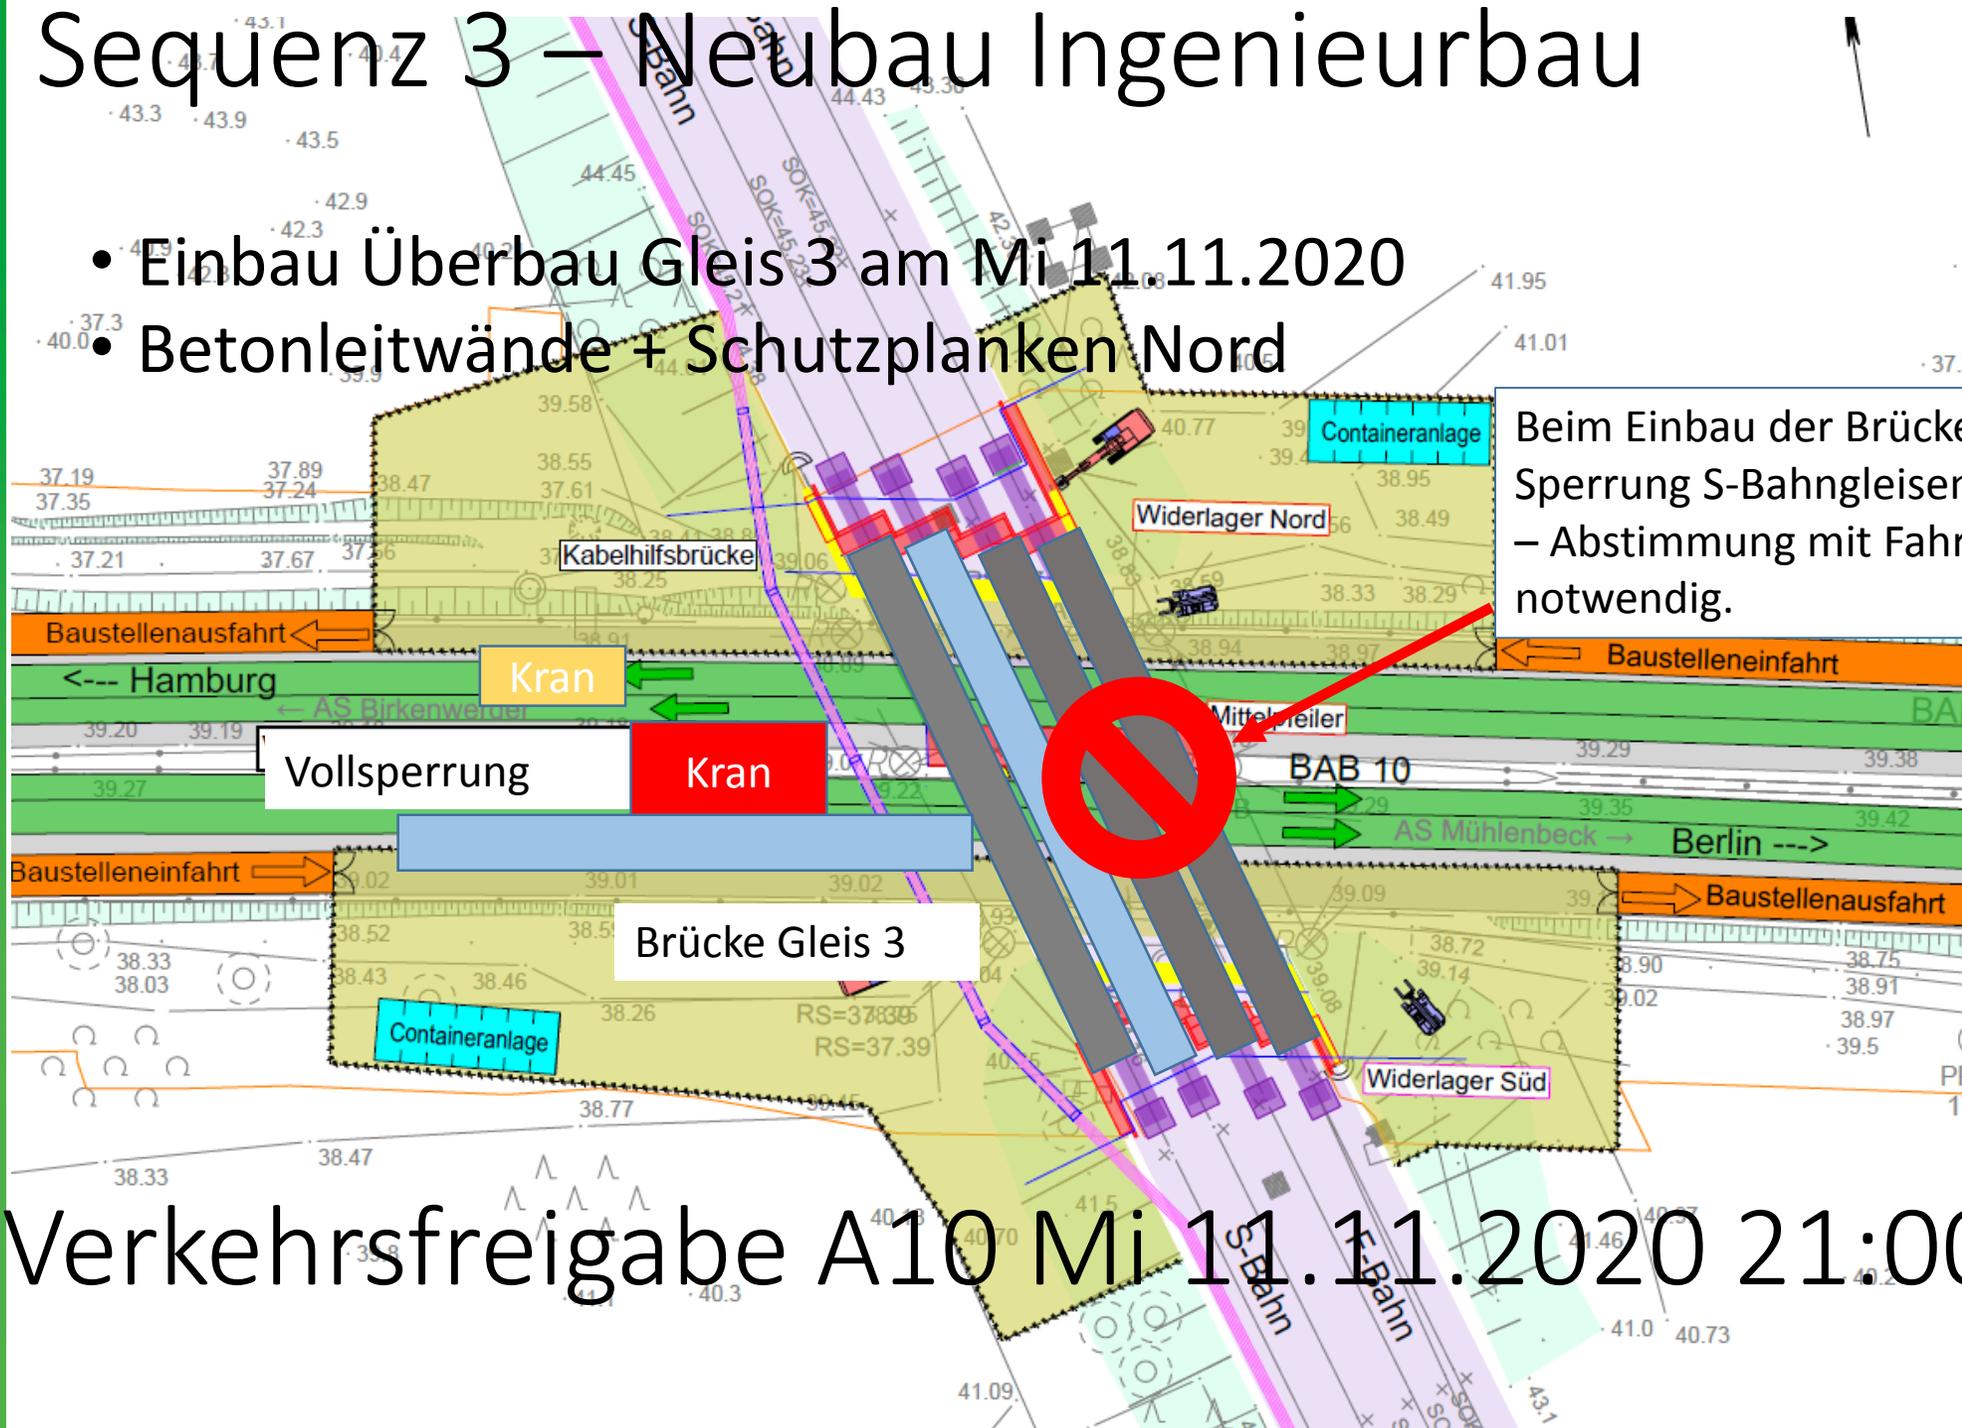

Verkehrsfreigabe A10 Mi 11.11.2020 21:00Uhr

Sequenz 4 – Neubau bahnaffine Leistungen

- Neubau Gleisbau Fr 13.11 20:30 Uhr bis So 15.11 22:00 Uhr
- Stromschiene und LST Endzustand So 15.11 22:00 Uhr bis Mo 16.11 04:00 Uhr

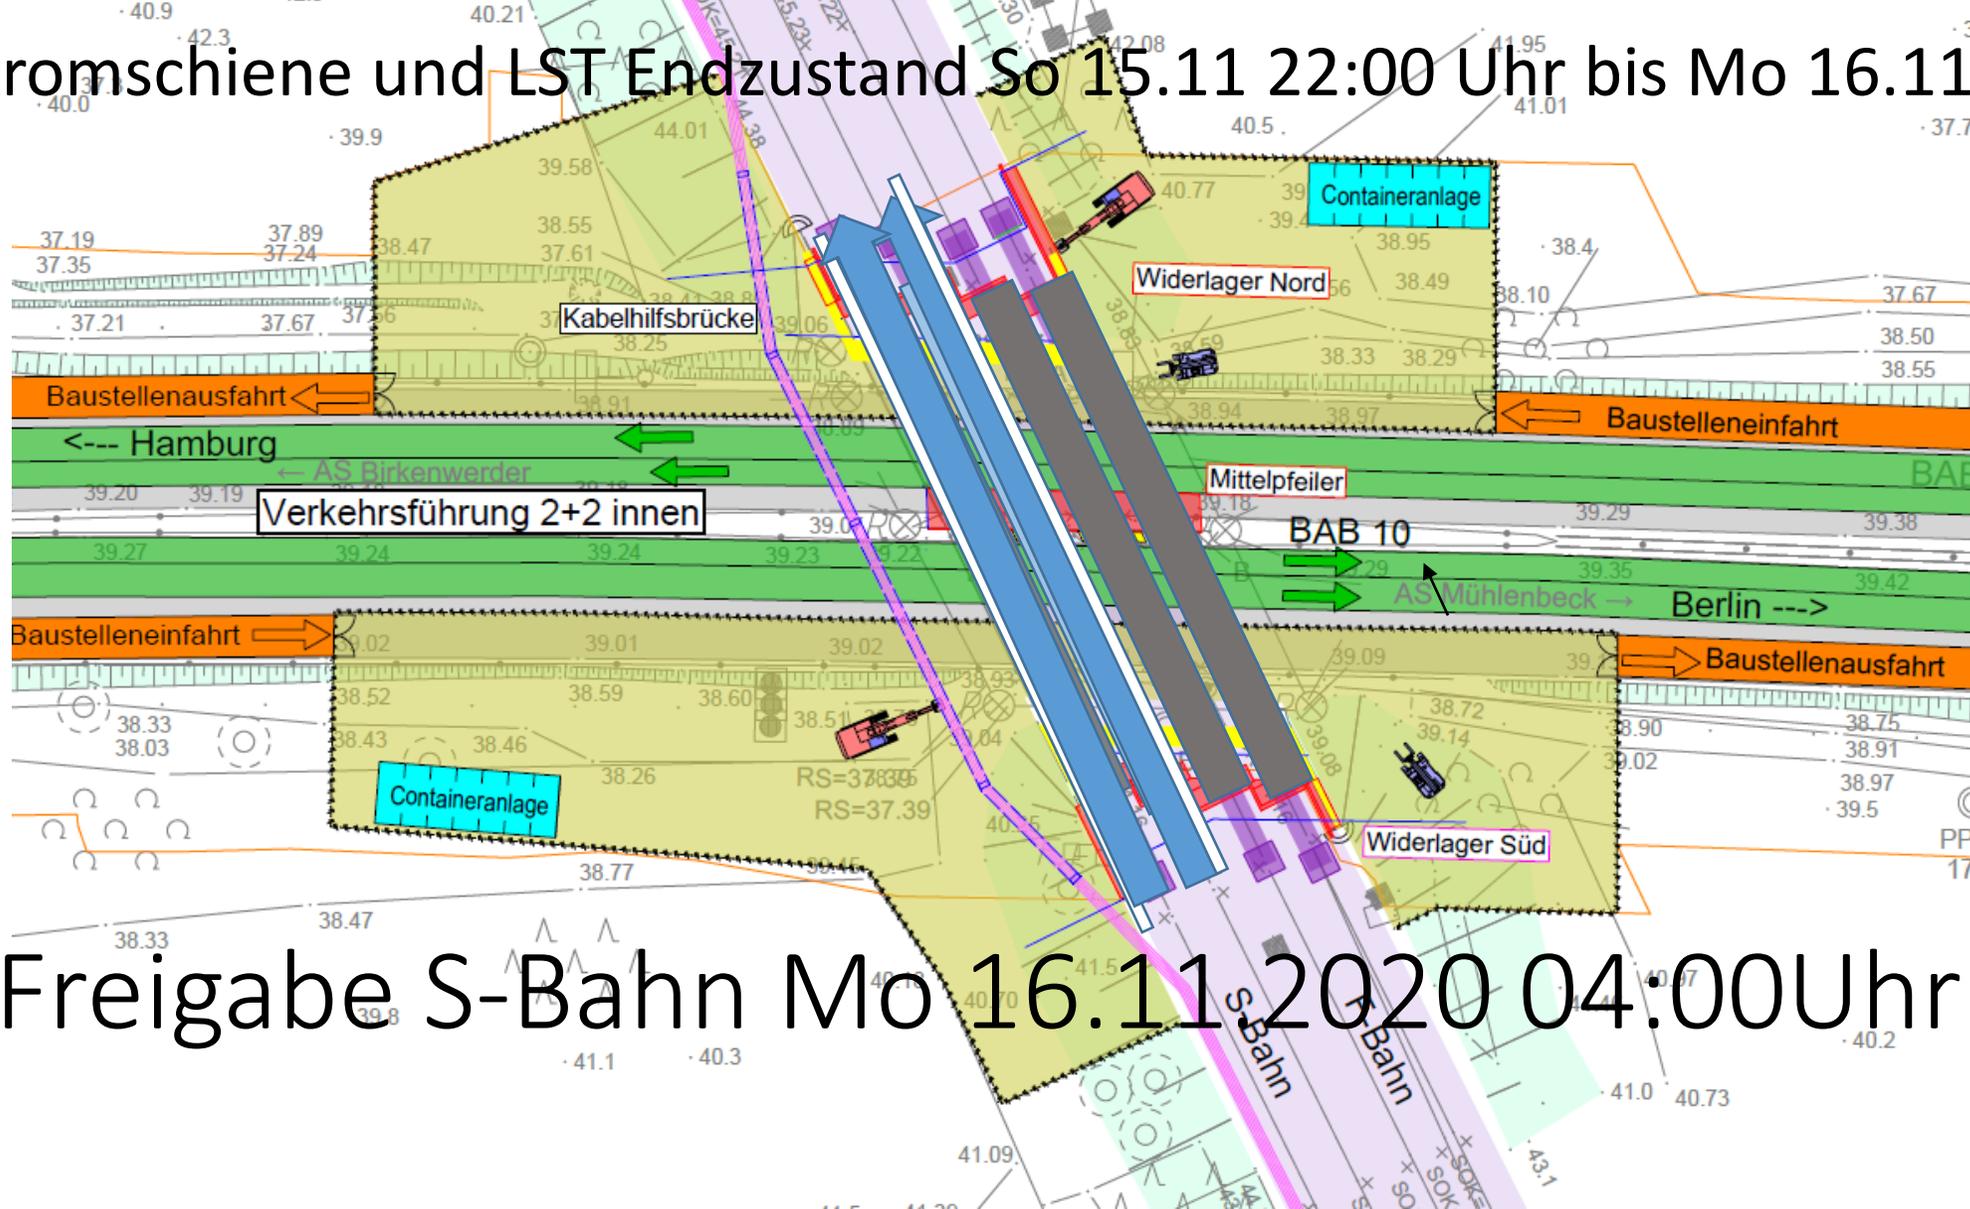

Freigabe S-Bahn Mo 16.11 2020 04:00Uhr

24

10

10

24


S-Bahn Baumaßnahmen - DB



S1 Umleitung Gesundbrunnen-Pankow-Blankenburg-Birkenwerder

- S-Bahn
- F-Bahn

Auszug S-Bahn-Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der BAB A10 bei Oranienburg (06. – 30.11.2020)

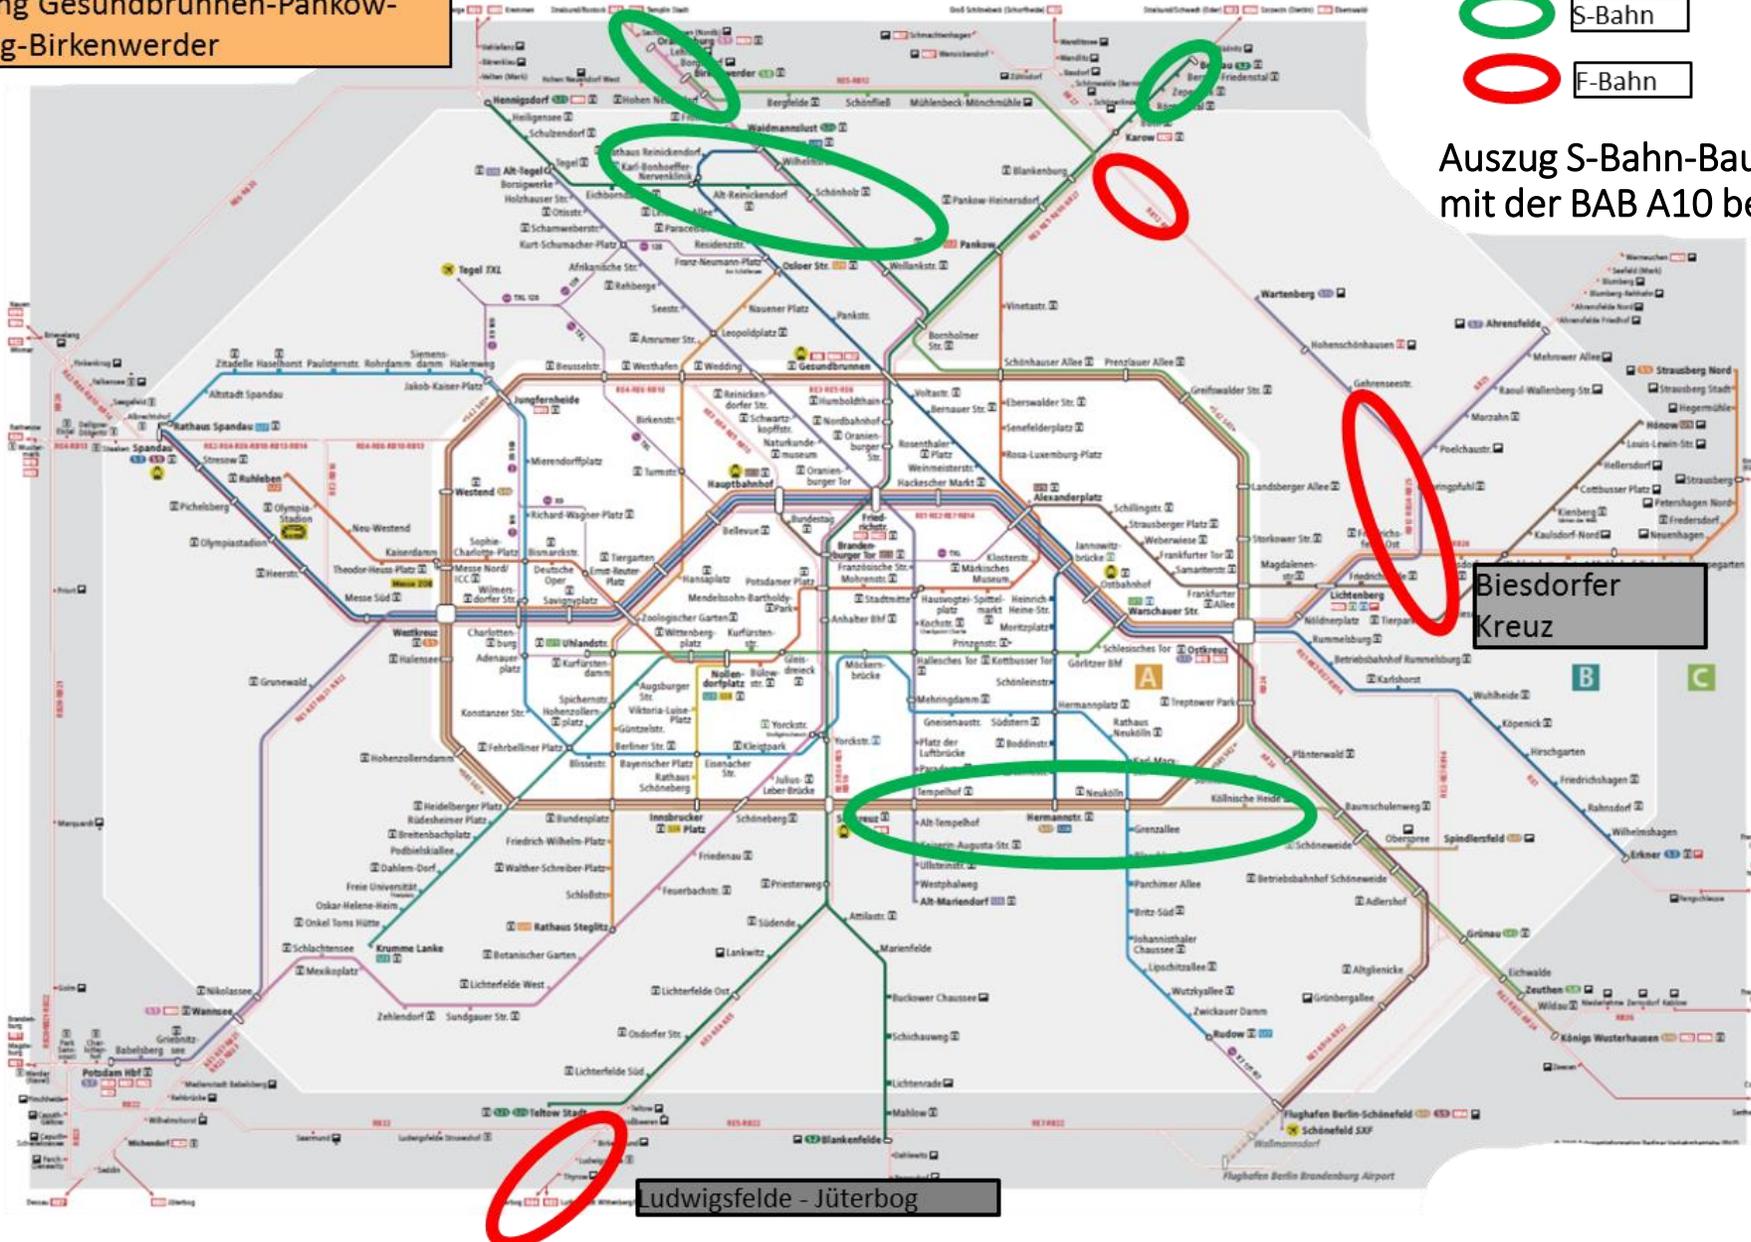



Auszug S-Bahn-Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der BAB A10 bei Oranienburg (06. – 30.11.2020)


Sperrungen Strecke 6030 Hohen Neuendorf - Oranienburg

		Nov 20																																
		Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
Einschränkungen bei...		30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	1.	
S1 Nord	EÜ A10 neu																																	
S1 Nord	GE Lehnitz - Oranienburg																																	
S8 Nord + S1 Nord	WE Hohen Neuendorf																																	
S8 Nord + S1 Nord	WE Hohen Neuendorf; Stromversorgung in Hon; DUA Weichen in Birkenwerder																																	

parallele Sperrungen Nord-Süd-System und Ring

		Nov 20																																
		Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
Einschränkungen bei...		30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	1.	
S1+S25 Nord	ESTWA Tegel (Kabelarbeiten; Querung herstellen); Kabelinstandsetzung in GE Hermannstr - Tempelhof;																																	
S41+S42 Ring Süd	Belastungsstopfgang nach GE Baumschulenweg-Hermanstr																																	
S2 Nord	EÜ Schönerlinder Str; Belastungsstopfgang nach GE																																	

- GE - Gleiserneuerung
- WE - Weichenerneuerung
- EU - Eisenbahnüberführung
- DUA - Durcharbeiten
- ESTW - Elektronisches Stellwerk

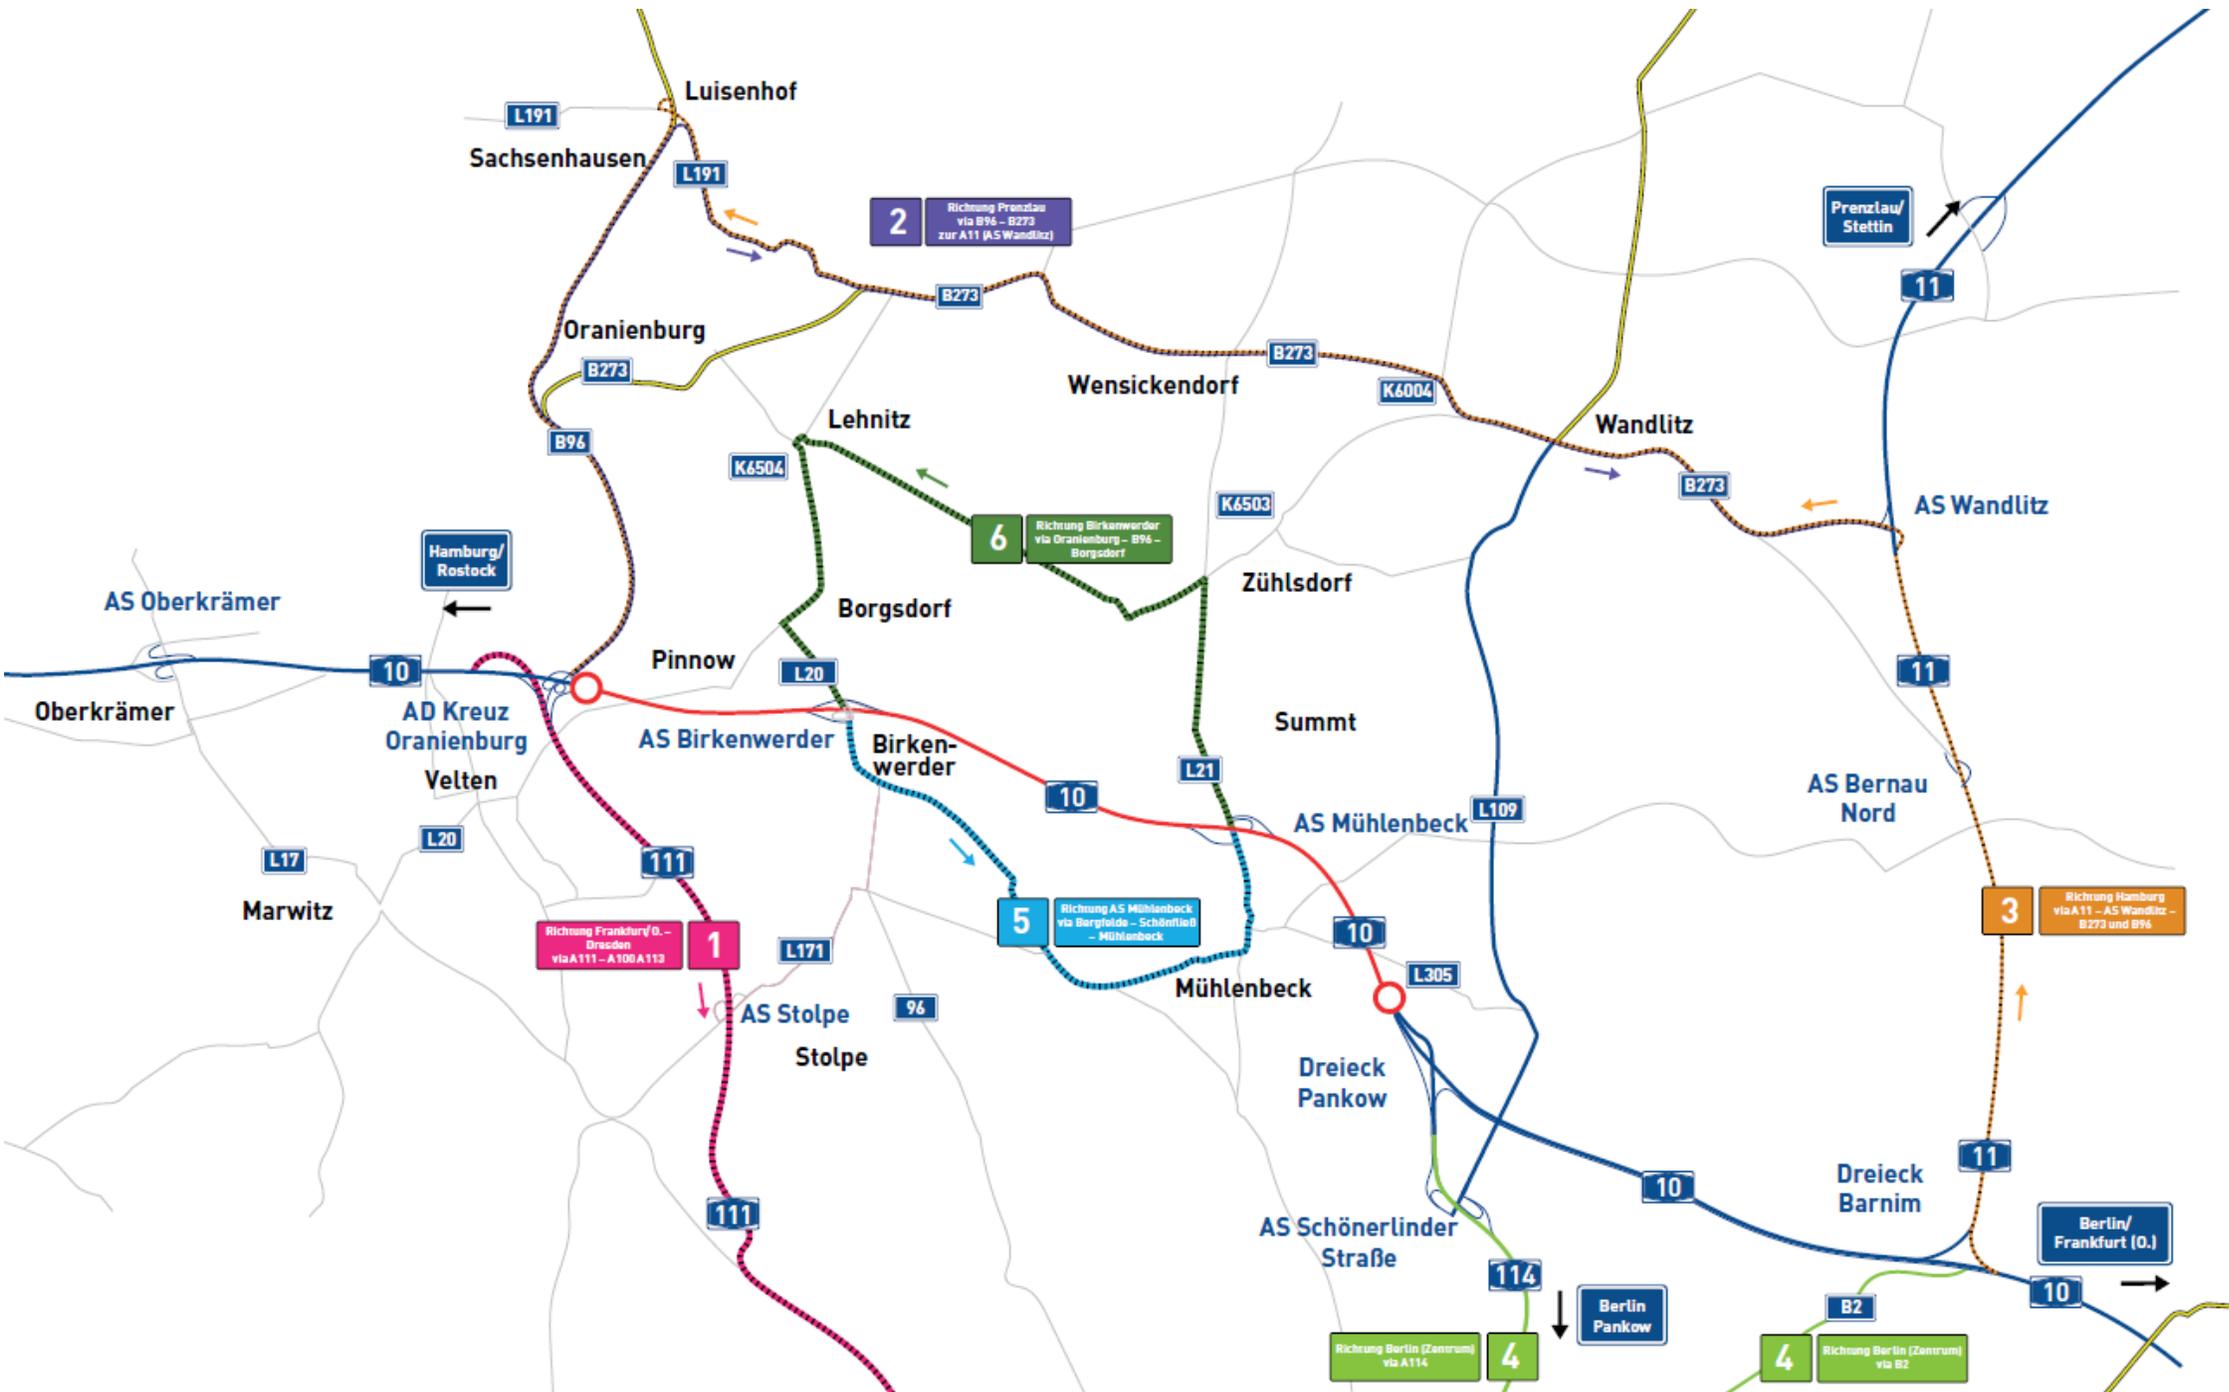

10

24


Umleitungskonzept



Umleitungskonzept

24

10

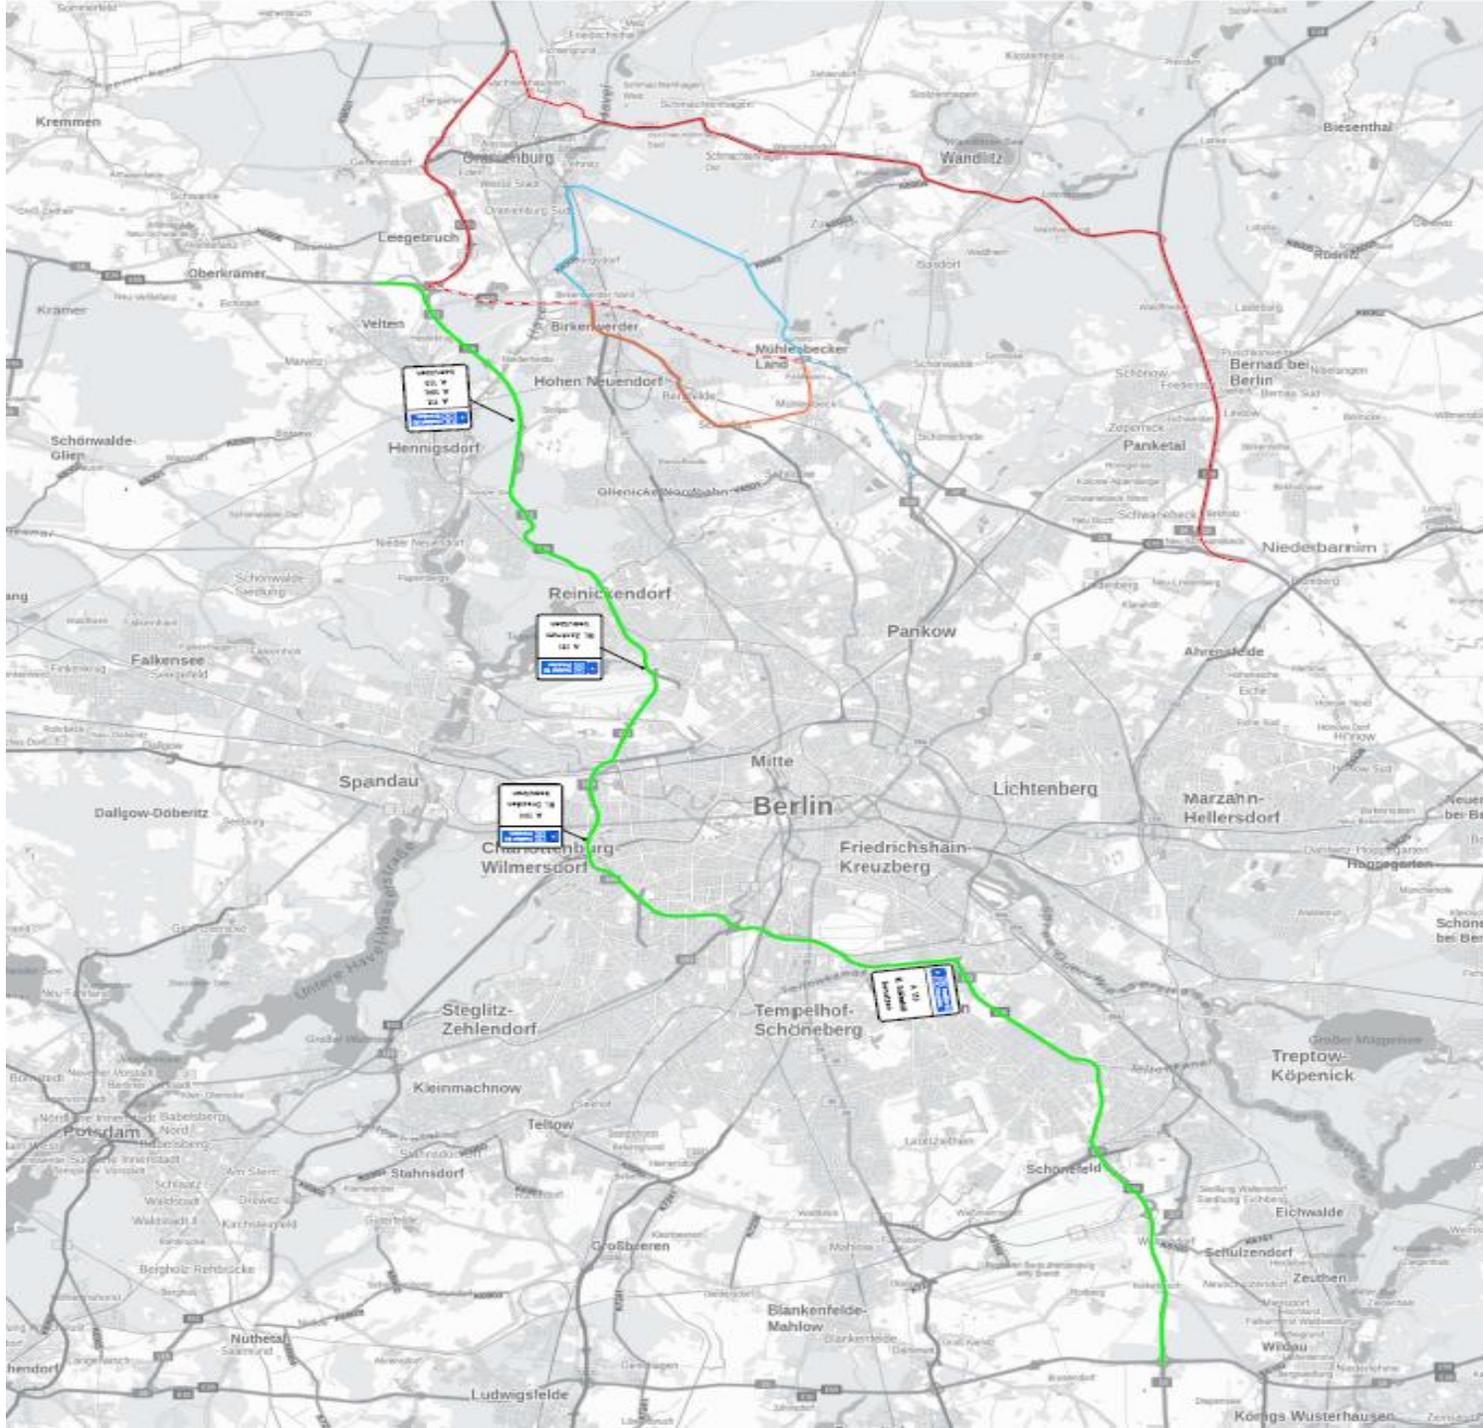

U	10 Frankfurt (O.)
	13 Dresden
A 111	
Ri. Zentrum	
benutzen	



Vollsperrung im Nov. 2020 und Sperrungen bis Ende des Jahres - Maßnahmen einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit

→ **Vorbereitungsphase**

General-Pressemitteilung mit einem Überblick über die bis Jahresende stattfindenden Maßnahmen

→ **Phase 1**

Vorab-Pressemitteilung zur Sperrpause 20 mit bundesweitem Verteiler

Pressekonferenz im Betriebszentrum Oberkrämer am 7.10.2020

Schriftliche Information an alle Berufsverbände des Schwerlastverkehrs

Schriftliche Information an Interessenvertretungen Verkehr

Konkrete Ansprachen regionaler Logistikunternehmen und Transportunternehmen

Presseinformationen für Anrainerstaaten in Landessprache

→ **Phase 2**

Wiederholung und Intensivierung der o.g. Maßnahmen

Detailinformationen www.havellandautobahn.de

Die Intention ist eine umfassende Kommunikationsstrategie mit dem Ziel, alle Verkehrsteilnehmer frühzeitig und wiederholend auf die bevorstehenden Einschränkungen hinzuweisen und dadurch möglichst viel Verkehr von der Vertragsstrecke und den Umleitungen fernzuhalten !



Kontaktinformationen

Pressestelle:

Steffen Schütz

Webseite:

www.havellandautobahn.de

Kontakt:

presse@havellandautobahn.de
